


1. 事象の概要

- 7/18早朝、3号機原子炉建屋オペレーティングフロア(以下、「オペフロ」という)にて瓦礫撤去作業開始時に湯気らしきもの(以下、「湯気」という)を確認(湯気は7/23、7/24、7/25にも確認)
 - 敷地境界のMPの値に変化無し
 - プラントパラメータに変化無し
 - RPV関連温度
 - PCVガス管理設備パラメータ
 - 原子炉は未臨界を確認
 - 気象状況
 - 7/18: 気温約21°C、湿度約92%
 - 7/23: 気温約20°C、湿度約91%
 - 7/24: 気温約20°C、湿度約91%
 - 7/25: 気温約21°C、湿度約91%
- ※湯気確認当日又は前日に降雨有り

(2013年7月25日現在の状況)

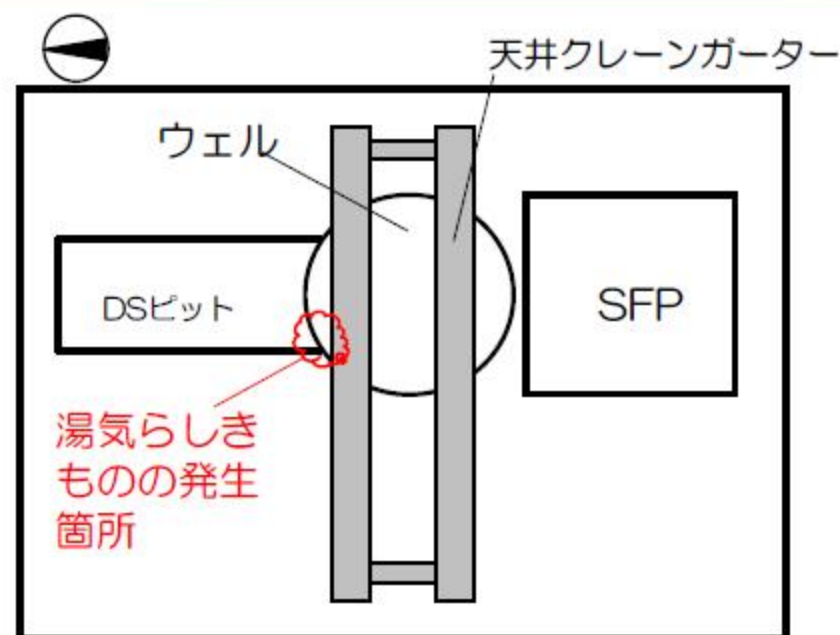

原子炉建屋5階 平面イメージ



湯気らしきものの写真(7/18)
