


# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成24年5月26日(土)  
 測定時間 : 11:10~12:30  
 測定器 : POLIMASTER  
 Xy Personal Dosimeter PM1610(線量率)  
 測定点 : 地上1.0m高さ  
 測定者 : (東大和久)きなやん  
 被ばく線量 : 18 $\mu$ Sv(借用APD)  
 道の駅ならば アスファルト面 3.5kcpm  
 GM BG800cpm(1m高さ)

10:20 : 道の駅ならば着0.34 $\mu$ Sv/h  
 : 受付免許証/許可書確認  
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用  
 10:40 : 出発  
 11:10 : 一次立入開始  
 12:30 : 一次立入終了  
 14:00 : スクリーニングサーベイ  
 >13kcpm 拭き取り除染を実施  
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可  
 14:30 : 終了

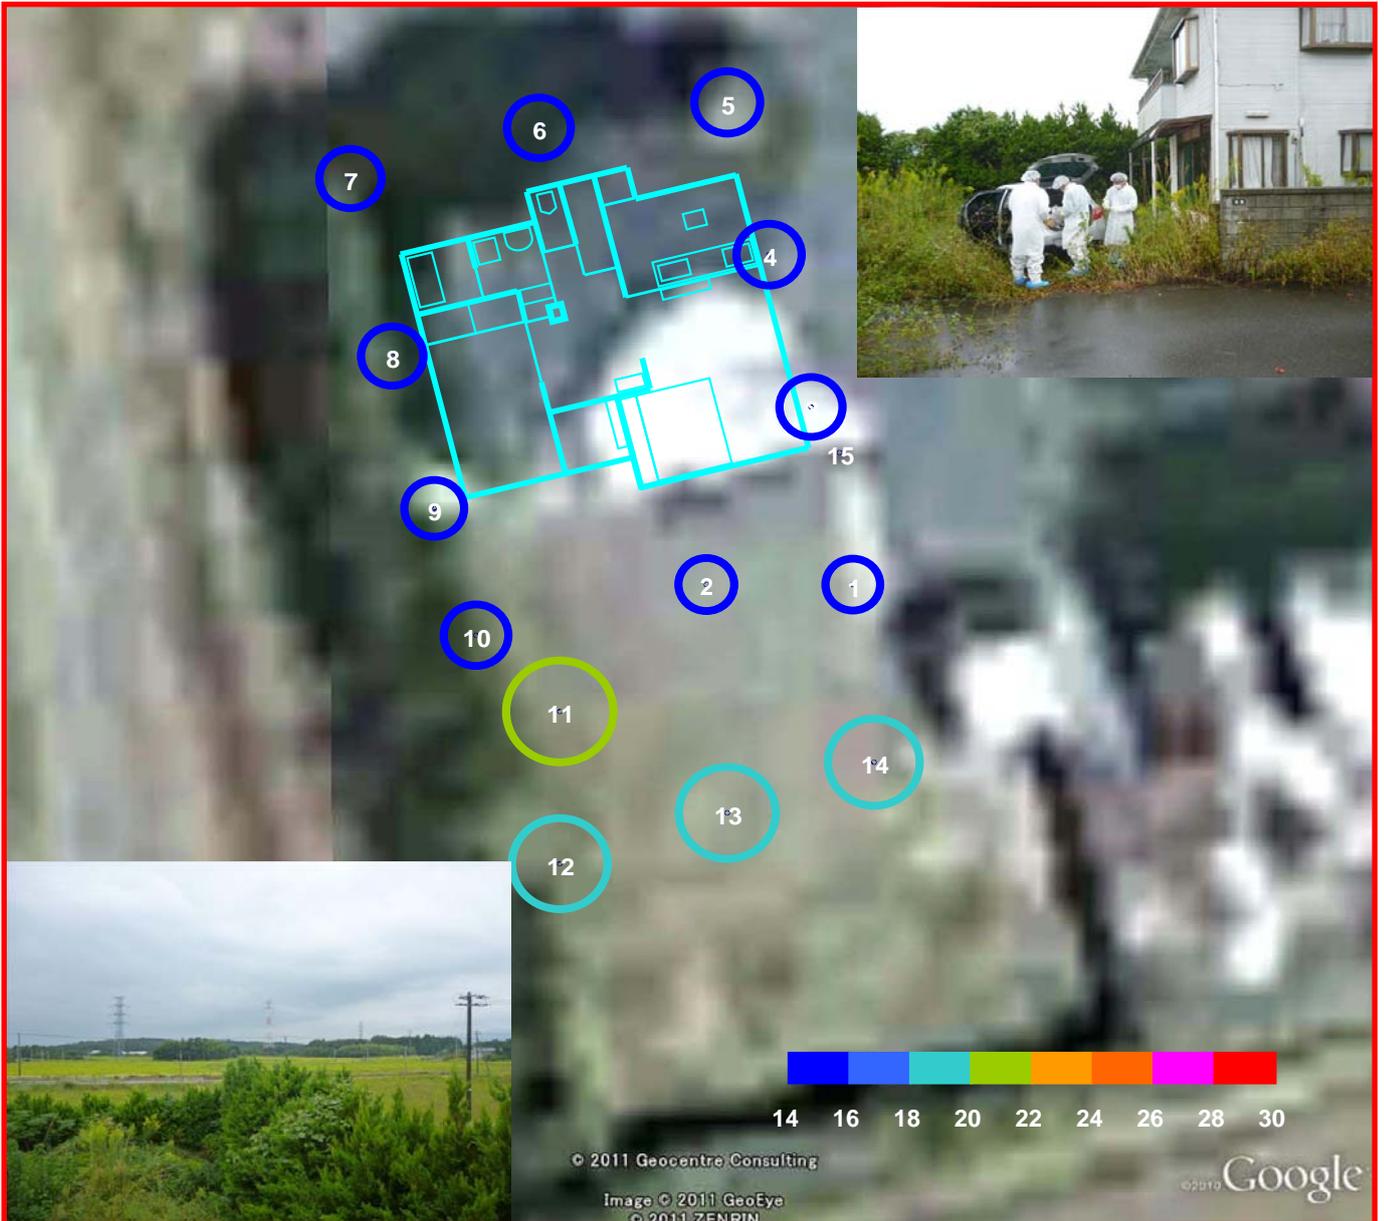

単位 :  $\mu$ Sv/hr

No.	8/3	11/26	3/18	5/26	平均:幾何平均	偏差:幾何標準偏差
1	13.7	17.2	13.2	10.4		
2	14.5	17.8	13.2	10.6		
3	17.6	17.7	15.3	12.0		
4	18.5	18.6	15.4	12.4		
5	20.1	18.6	15.9	12.5		
6	20.5	18.5	16.1	12.1		
7	20.8	18.7	16.2	11.9		
8	22.3	18.7	16.4	11.9		
9	23.0	18.9	16.6	11.4		
10	15.2	18.1	15.2	12.3		
11	17.5	18.4	15.8	20.4		
12	18.1	18.9	16.4	18.2		
13	17.9	18.6	17.0	18.4		
14	17.5	18.6	16.6	17.4		
15		37.4				
16						
17						
18						
平均	18.2	19.3	15.6	13.4		
偏差	1.17	1.20	1.08	1.25		

