


大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成26年9月13日(土)
 測定時間 : 11:14~12:30
 測定器 : ATOMTEX AT6130C


測定点 : 地上1.0m高さ(車両内で測定)
 測定者 : (東大和久)きなやん、OBいずさん、はしやん
 被ばく線量 : 9、9、10 μ Sv(借用APD)

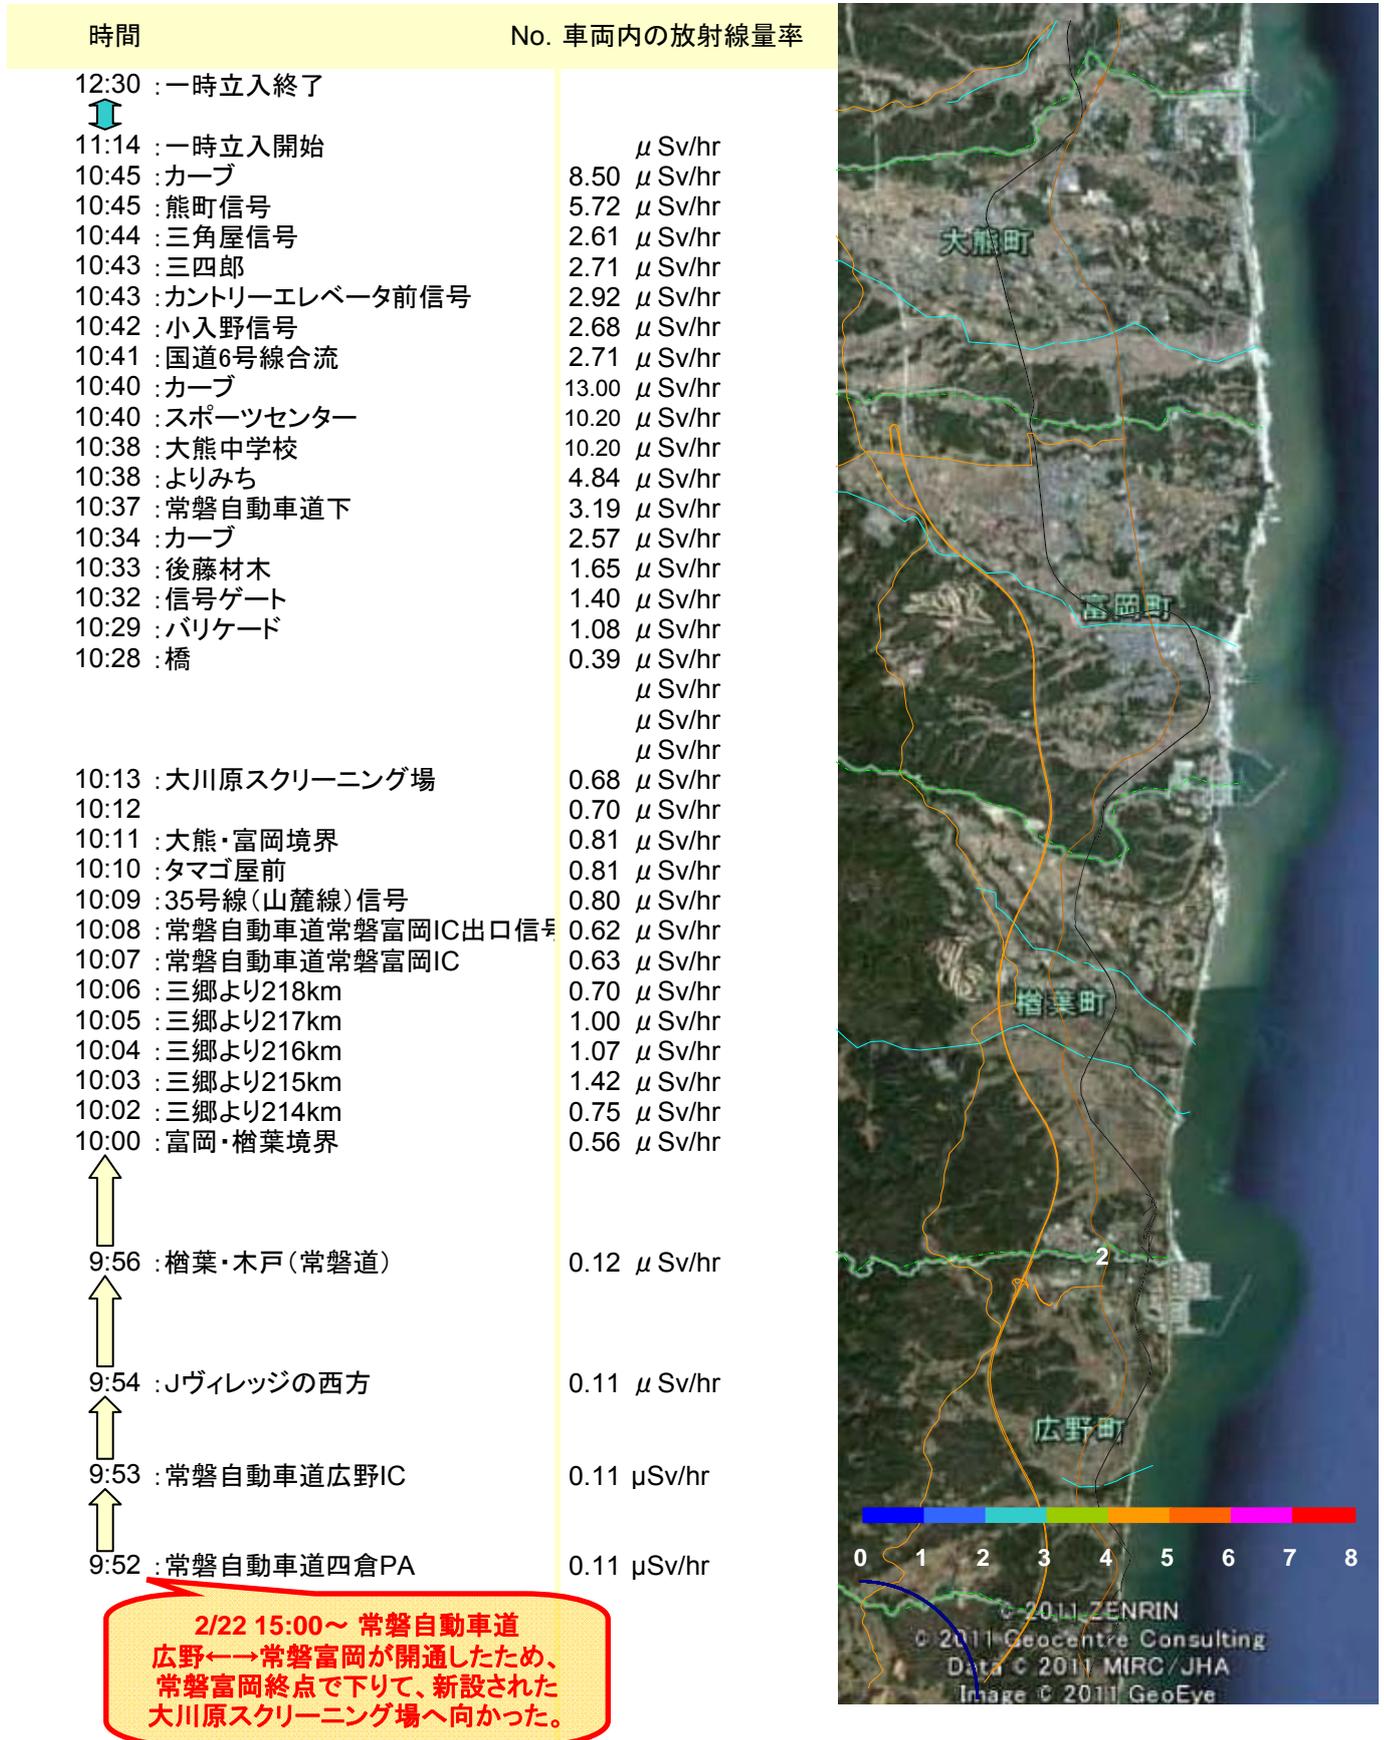

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成26年6月8日(日)
 測定時間 : 12:00~13:00
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ(車両内で測定)
 測定者 : (東大和久)きなやん、さかさん、さとさん・はしや
 被ばく線量 : 8、6、8、8 μ Sv(借用APD)

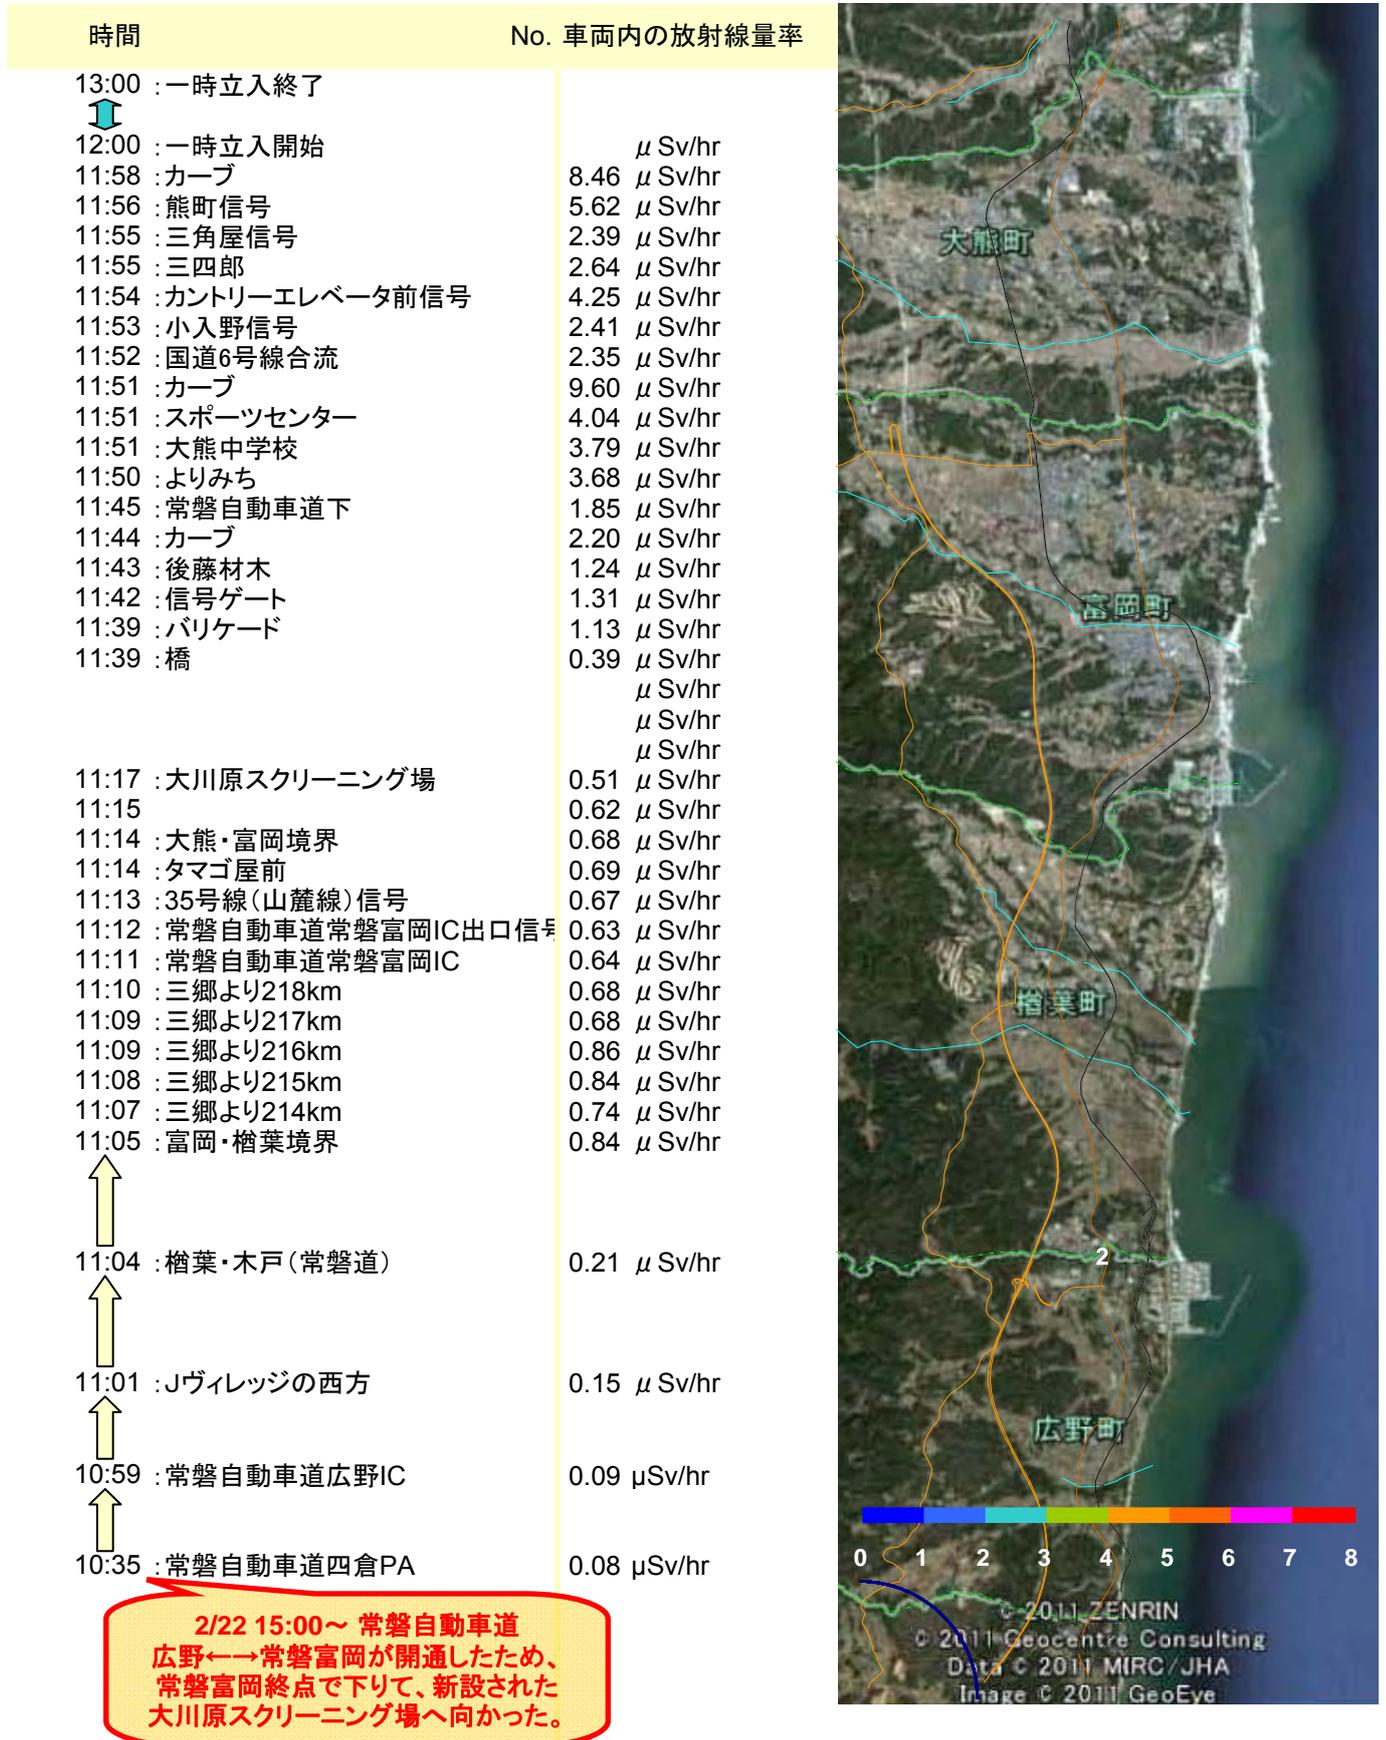

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成26年2月22日(土)
 測定時間 : 10:55~12:14
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん、OBいずさん、OBかわさん
 被ばく線量 : 10、9、9 μ Sv(借用APD)

時間	No.	車両内の放射線量率
12:14 : 一時立入終了		
↕		
10:55 : 一時立入開始	13.	4.50 μ Sv/hr
↑		
10:53 : 東大和久入口	12.	2.74 μ Sv/hr
↑		
10:52 : 三角屋交差点	11.	3.03 μ Sv/hr
↑		
10:51 : トミー前坂全体	10.	4.22 μ Sv/hr
↑		
10:51 : 熊川	9.	4.45 μ Sv/hr
↑		
10:49 : 富岡・大熊境界	8.	2.41 μ Sv/hr
↑		
10:48 : 夜ノ森入口	7.	1.51 μ Sv/hr
↑		
10:44 : 富岡町役場	6.	1.20 μ Sv/hr
↑		
10:25 : 福島第二原子力発電所 受付(毛萱スクリーニング場) 免許証/許可書確認 防護装備着用 APD/トランシーバー借用	5.	0.36 μ Sv/hr
↑		
10:13 : 富岡・楢葉境界	4.	0.19 μ Sv/hr
↑		
10:04 : 楢葉・木戸(旧国道6号線)	3.	0.17 μ Sv/hr
↑		
9:57 : Jヴィレッジ	2.	0.16 μ Sv/hr
↑		
9:51 : 常磐自動車道広野IC	1.	0.23 μ Sv/hr
↑		
9:40 : 常磐自動車道四倉PA		0.07 μ Sv/hr




2/22 15:00~ 常磐自動車道
 広野←→常磐富岡が開通するため、
 広野ICには開通セレモニーに参加する
 車が、たくさん並んでいました。

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年11月2日(土)
 測定時間 : 10:40~11:33
 測定器 : ATOMTEX AT6130C


測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん、マー君
 被ばく線量 : 13、12 μ Sv(借用APD)

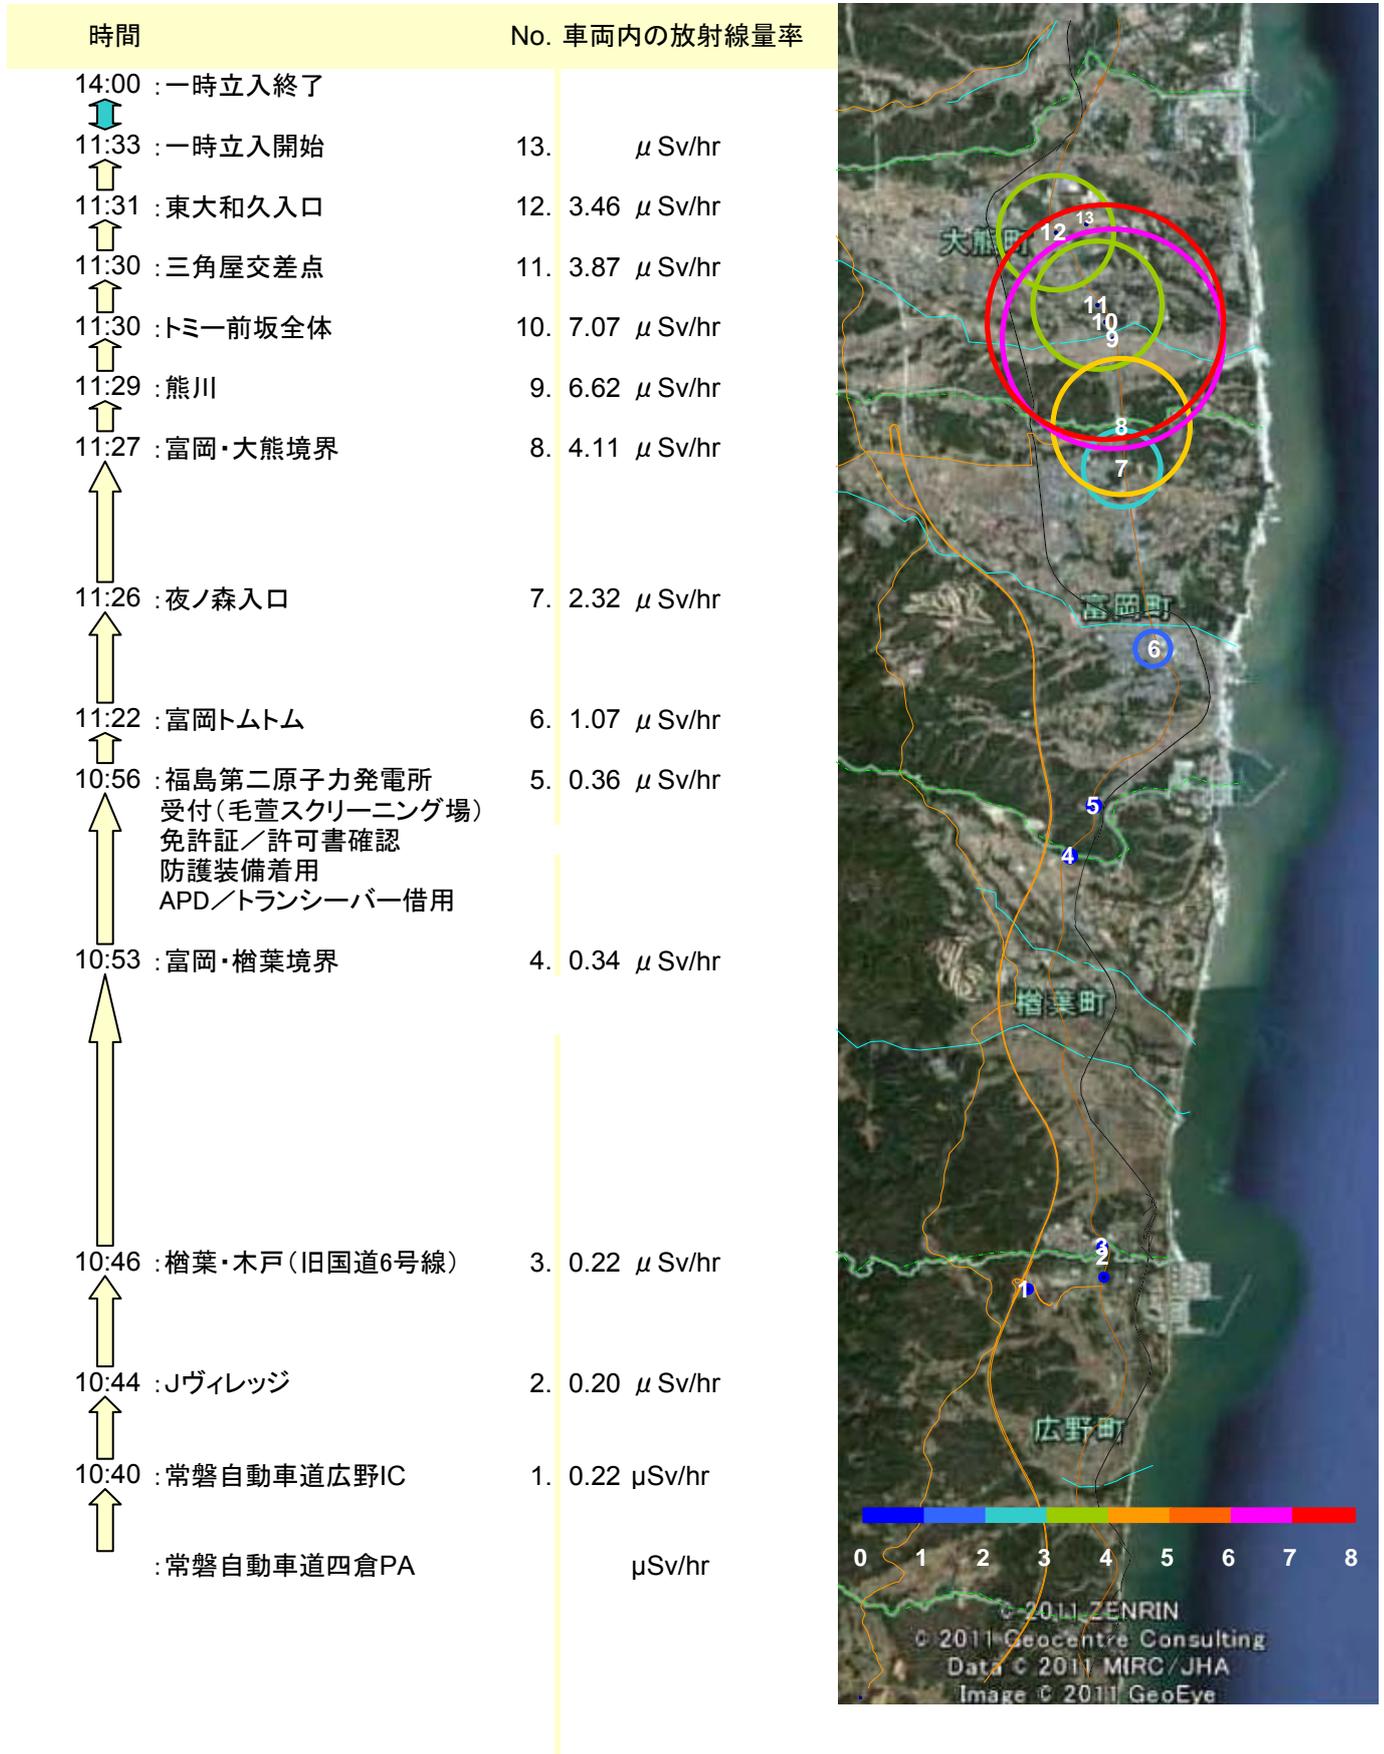

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年8月10日(土)
 測定時間 : 11:30~13:30
 測定器 : ATOMTEX AT6130C


測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん、マー君
 被ばく線量 : 8、9 μ Sv(借用APD)

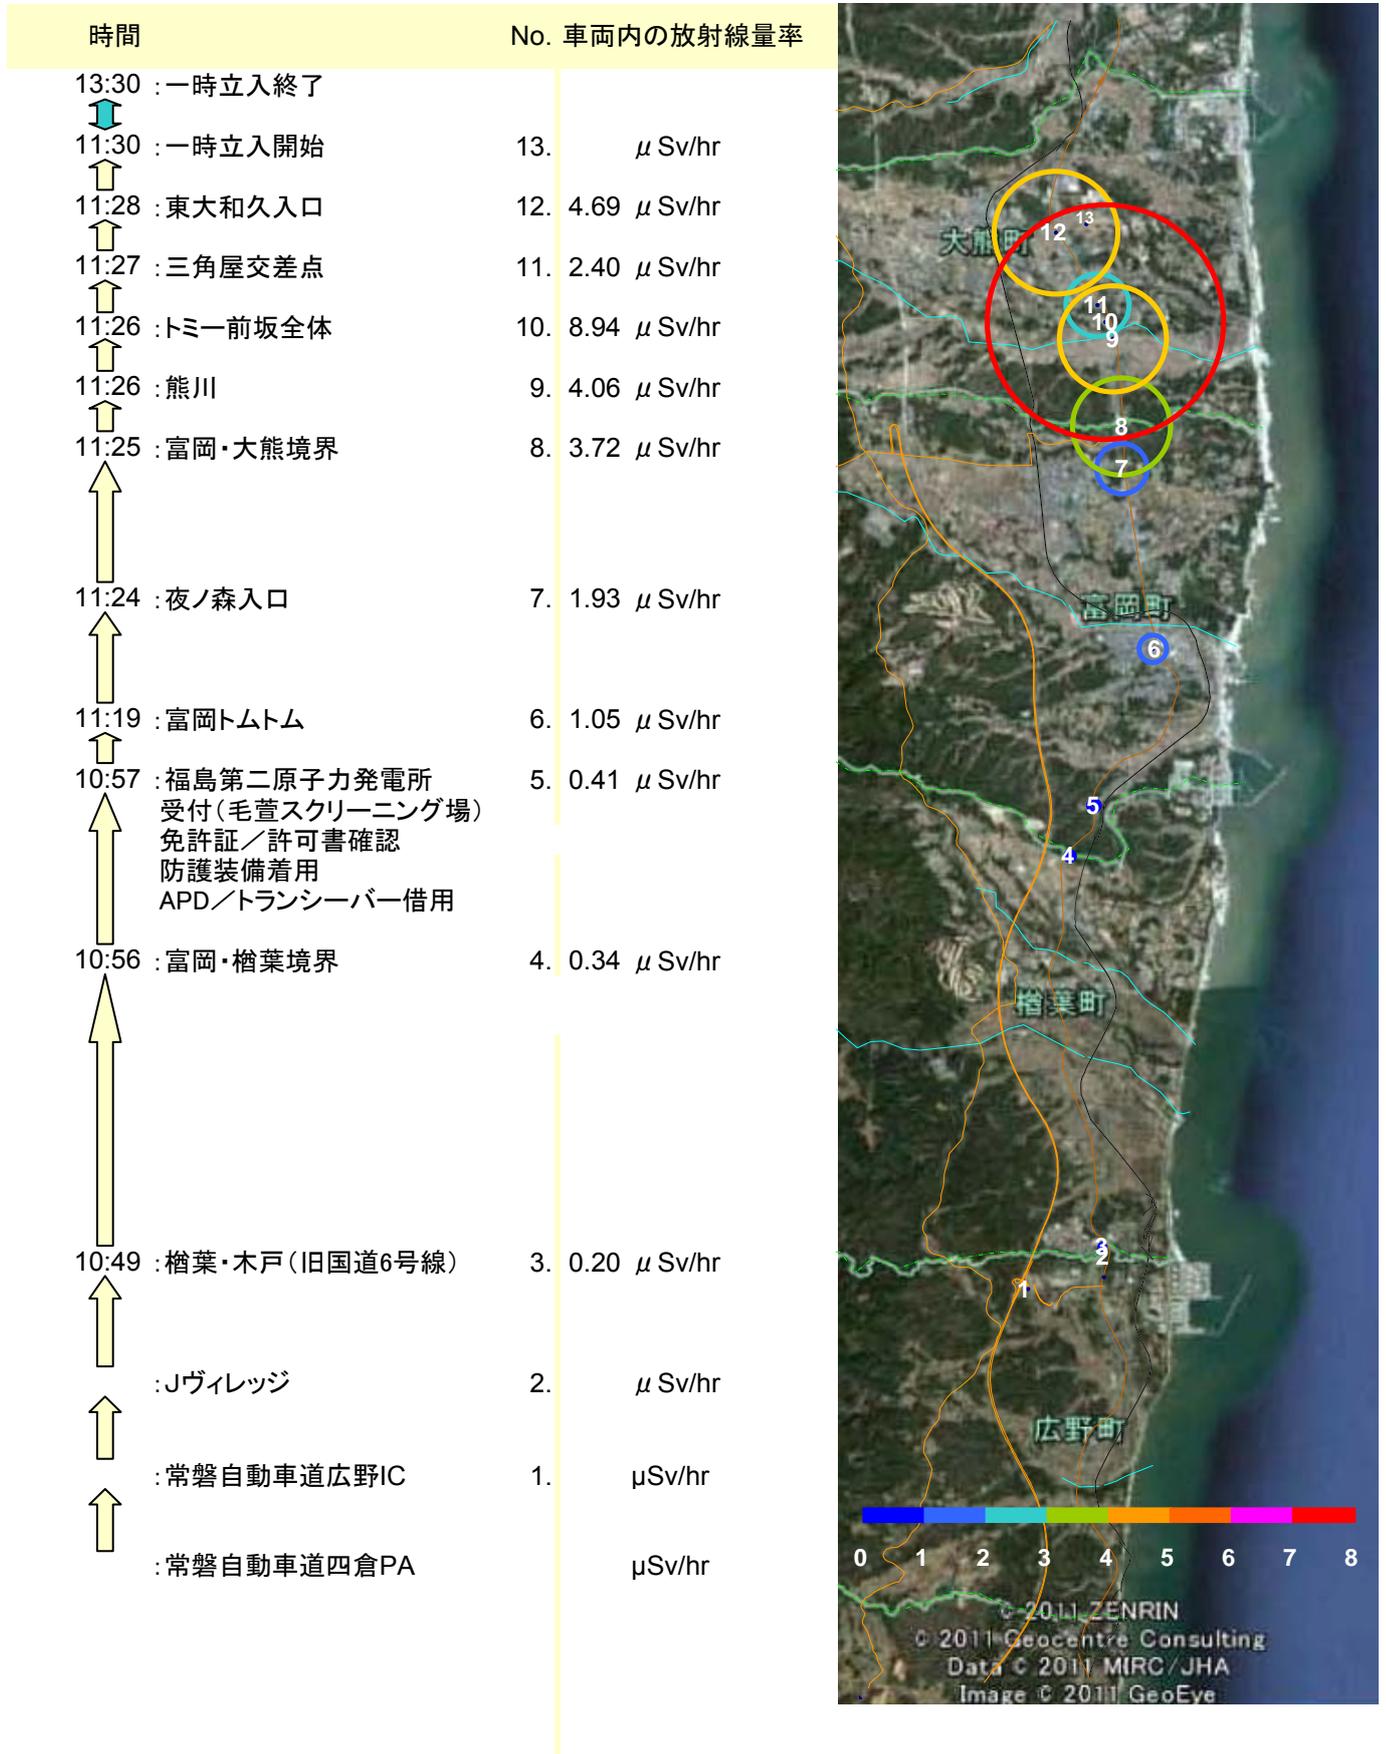

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年6月8日(土)
 測定時間 : 11:10~12:10
 測定器 : ATOMTEX AT6130C


測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん、マー君
 被ばく線量 : 13 μ Sv(借用APD)

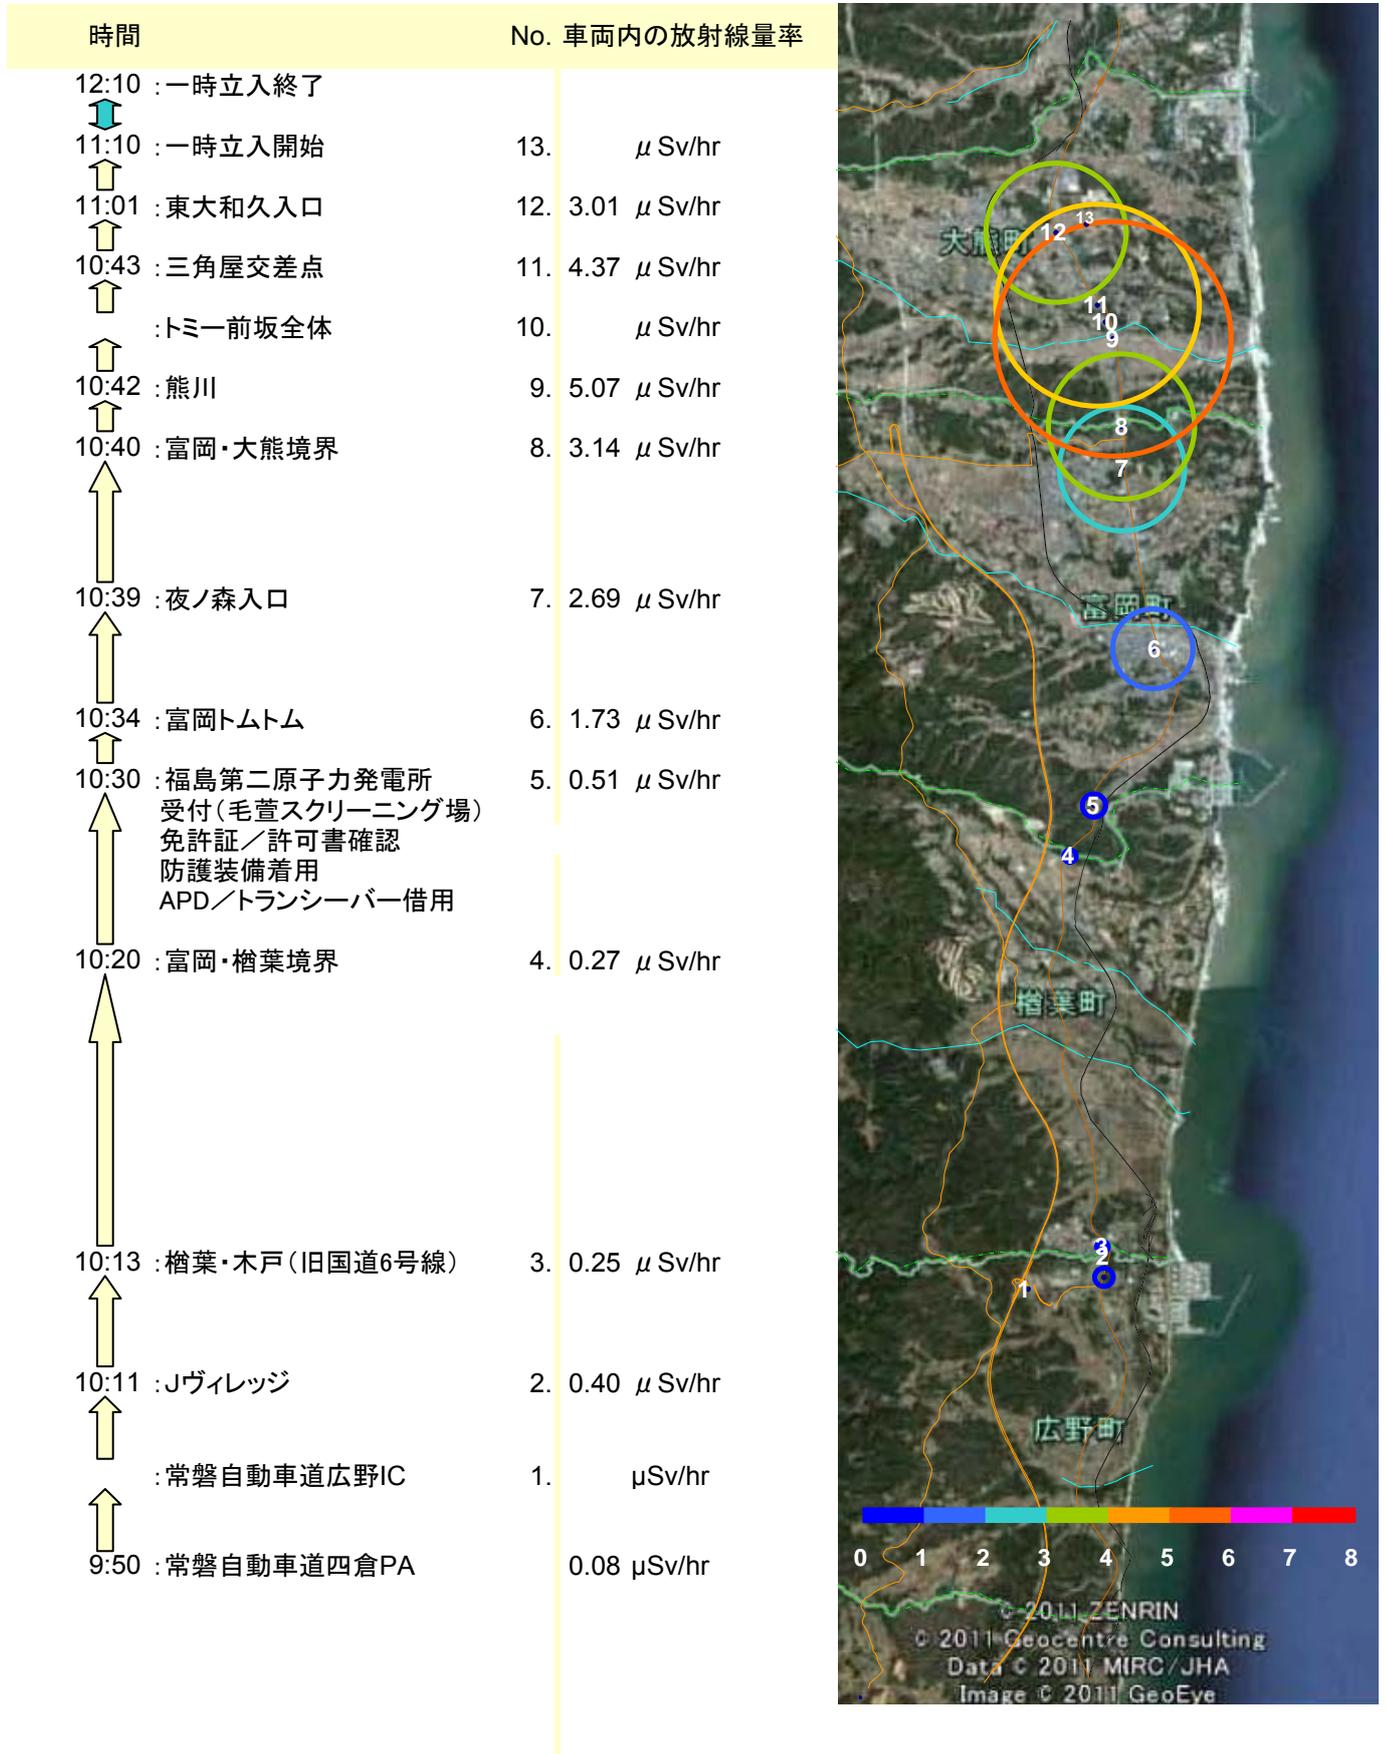

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成25年3月23日(土)
 測定時間 : 10:25~12:45
 測定器 : ATOMTEX AT6130C


測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん、富さん
 被ばく線量 : 20 μ Sv(借用APD)

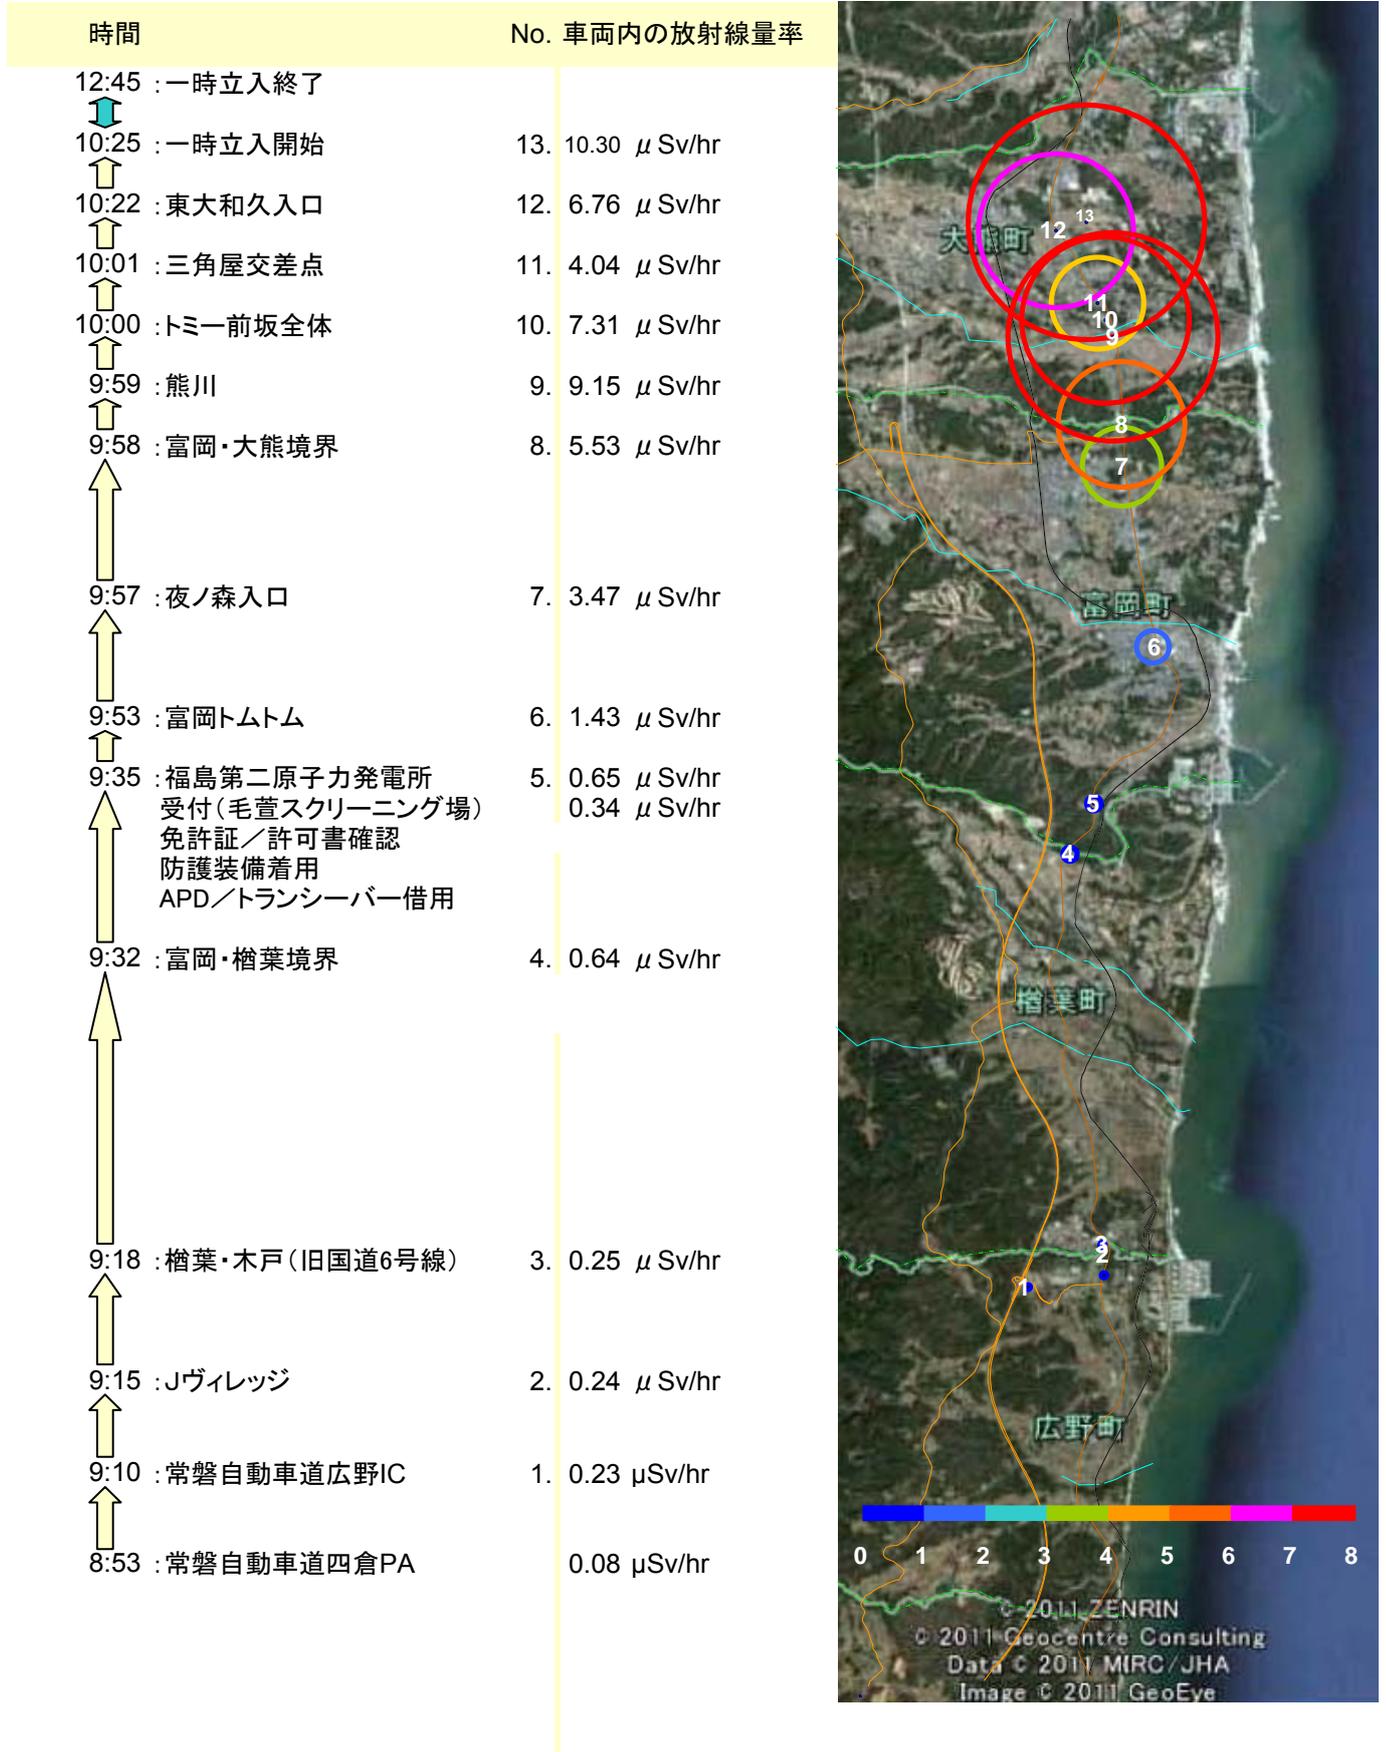

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成24年11月23日(金)
 測定時間 : 9:50~12:10
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん、坂さん
 被ばく線量 : - μ Sv(借用APD)

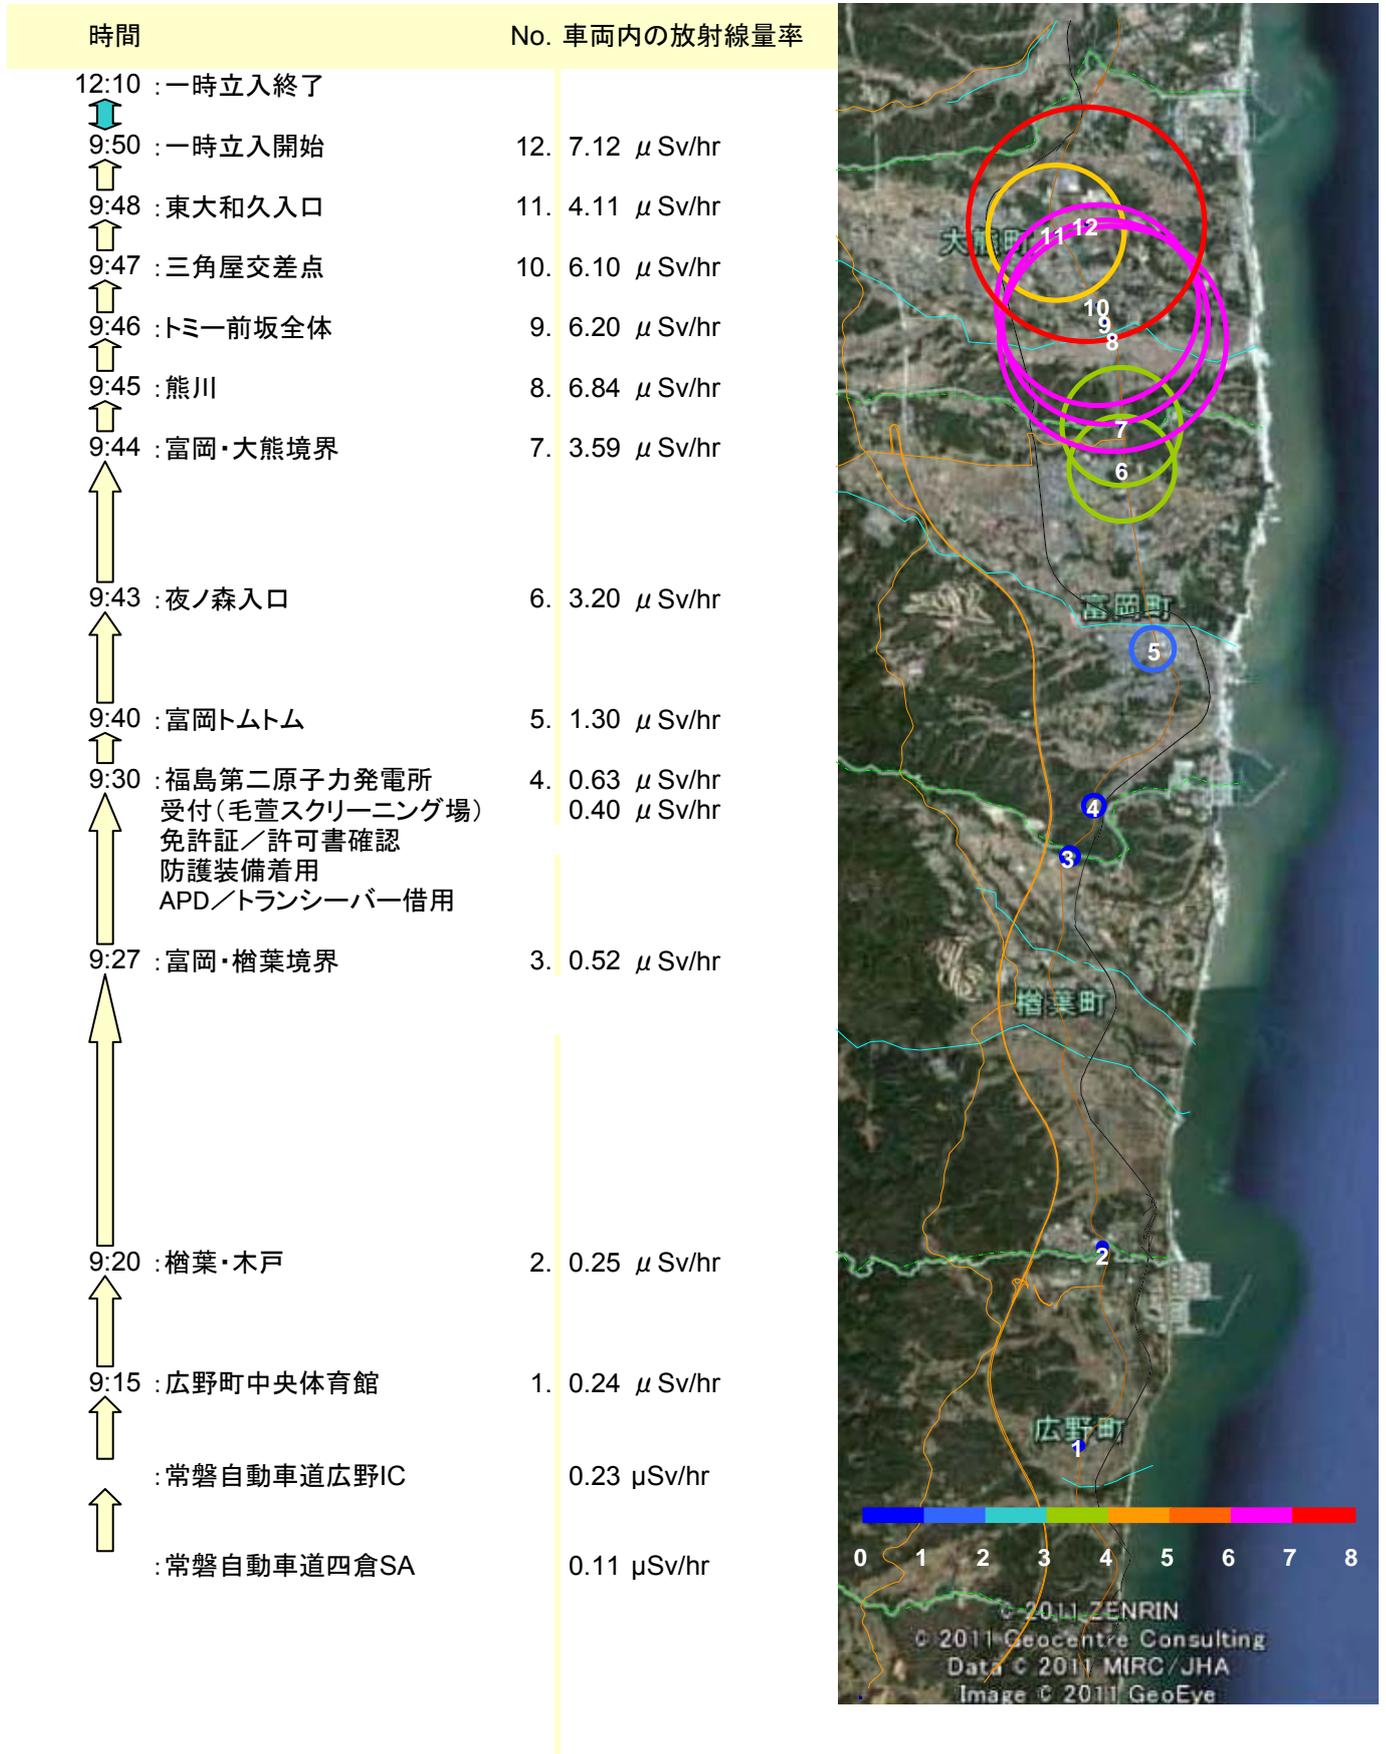

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成24年10月7日(日)

測定時間 : 9:45~12:50


測定器 : POLIMASTER

Xy Personal Dosimeter PM1610(線量率)

測定点 : 地上1.0m高さ

測定者 : (東大和久)きなやん、坂さん

被ばく線量 : 24 μ Sv(借用APD)

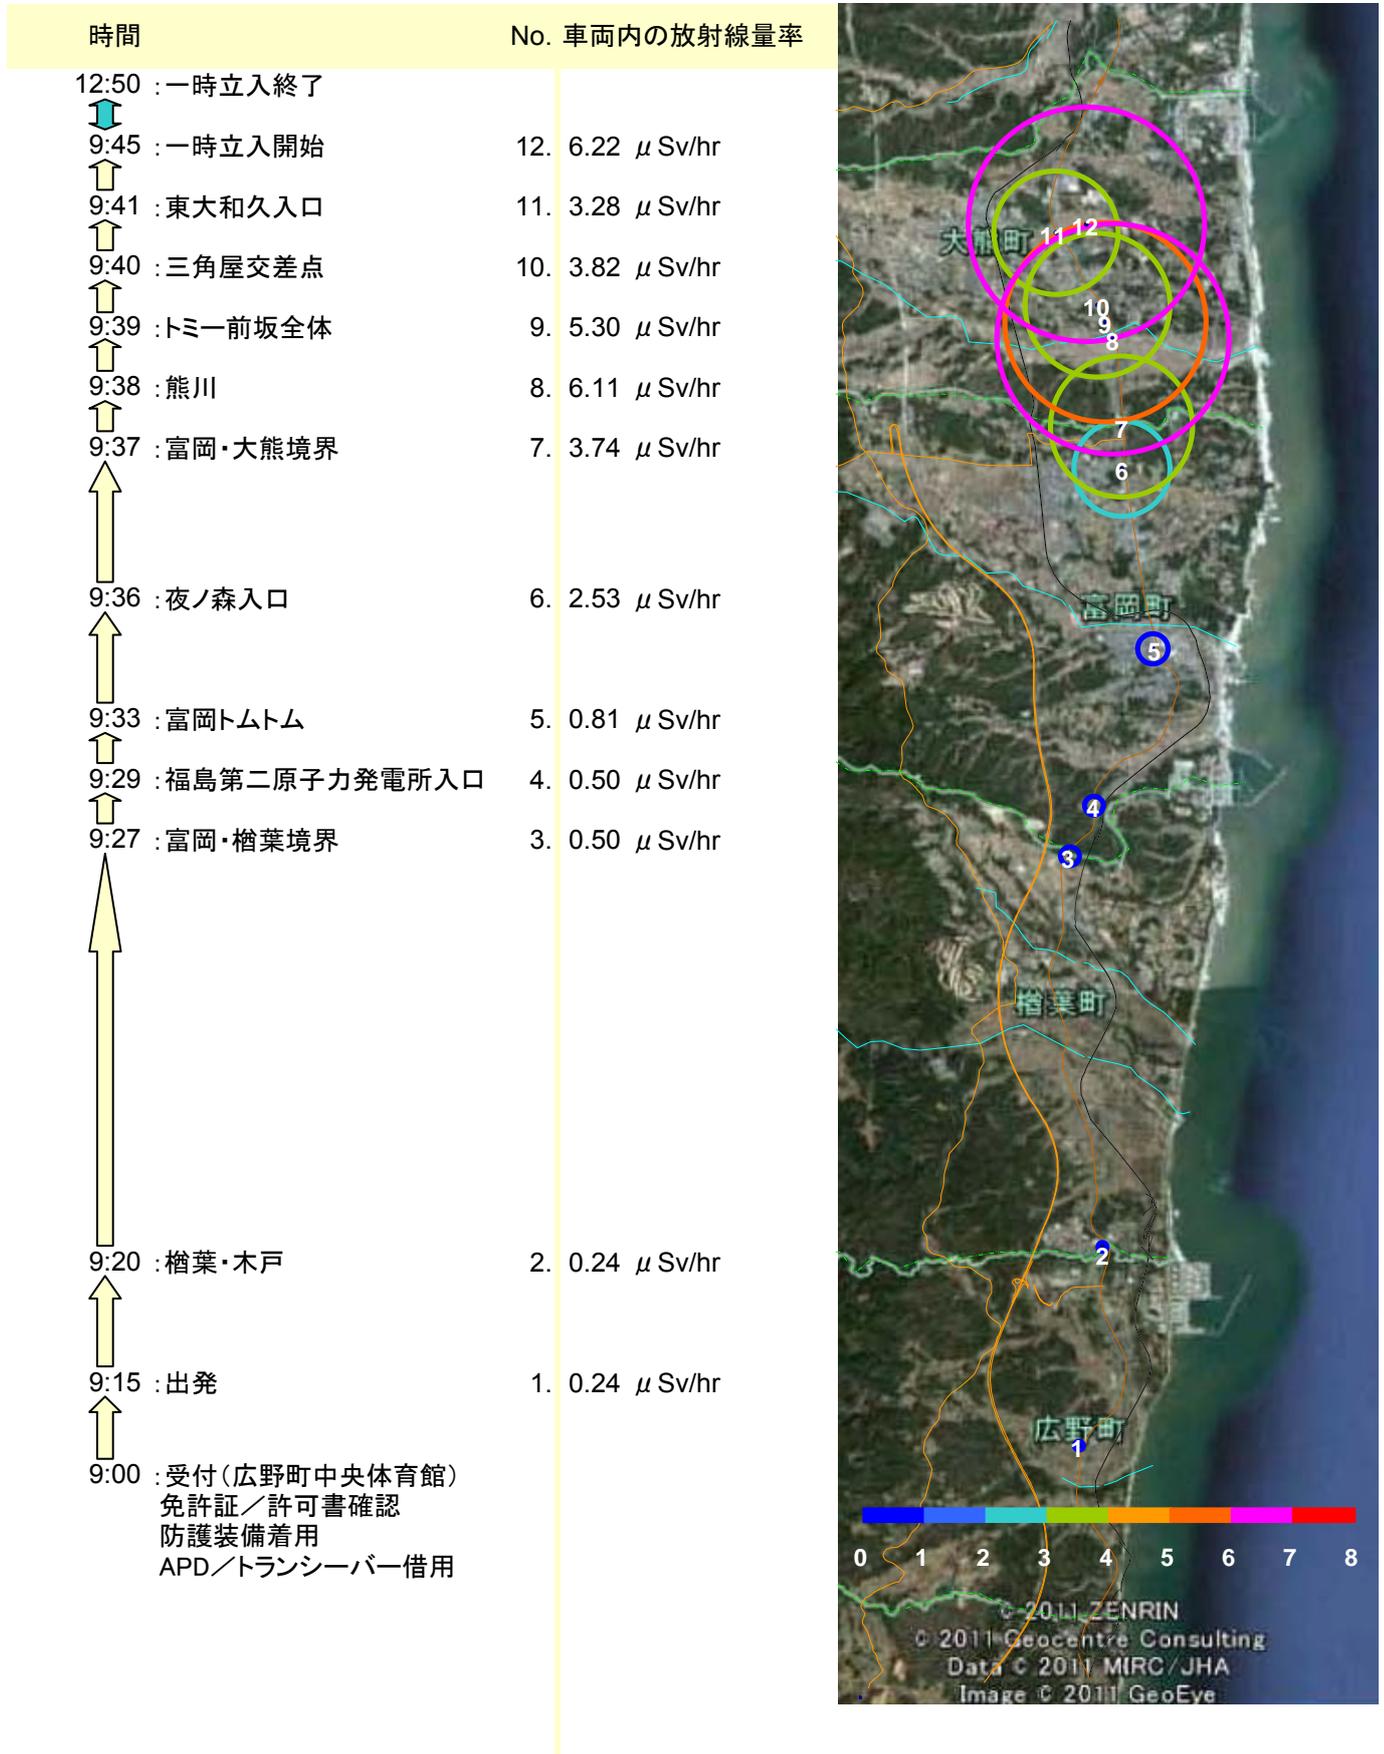

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成23年11月26日(土)

測定時間 : 10:40~12:50

測定器 : POLIMASTER

Xy Personal Dosimeter PM1610(線量率)

測定点 : 地上1.0m高さ

測定者 : (東大和久)きなやん/ゆーみん

被ばく線量 : 26 μ Sv/22 μ Sv(借用APD)

: 26.18 μ Sv/23.0 μ Sv(個人線量計)

