


大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成27年4月25日(土)
 測定時間 : 12:00~12:40
 測定器 : ATOMTEX AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ
 測定者 : (東大和久)きなやん・(水戸)おがちゃん
 : (東海)OBいずさん・(所沢)はしやん
 被ばく線量 : きなやん14・おがちゃん15
 : OBいずさん15・はしやん15 μ Sv(借用APD)

10:45 : 加倉スクリーニング場
 : 受付免許証/許可書確認
 防護装備着用、APD/トランシーバー借用
 10:50 : 出発
 12:00 : 一次立入開始
 12:40 : 一次立入終了
 14:50 : スクリーニングサーベイ(at毛萱スクリーニング場
 >13kcpm 拭き取り除染を実施
 人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可
 15:00 : 終了

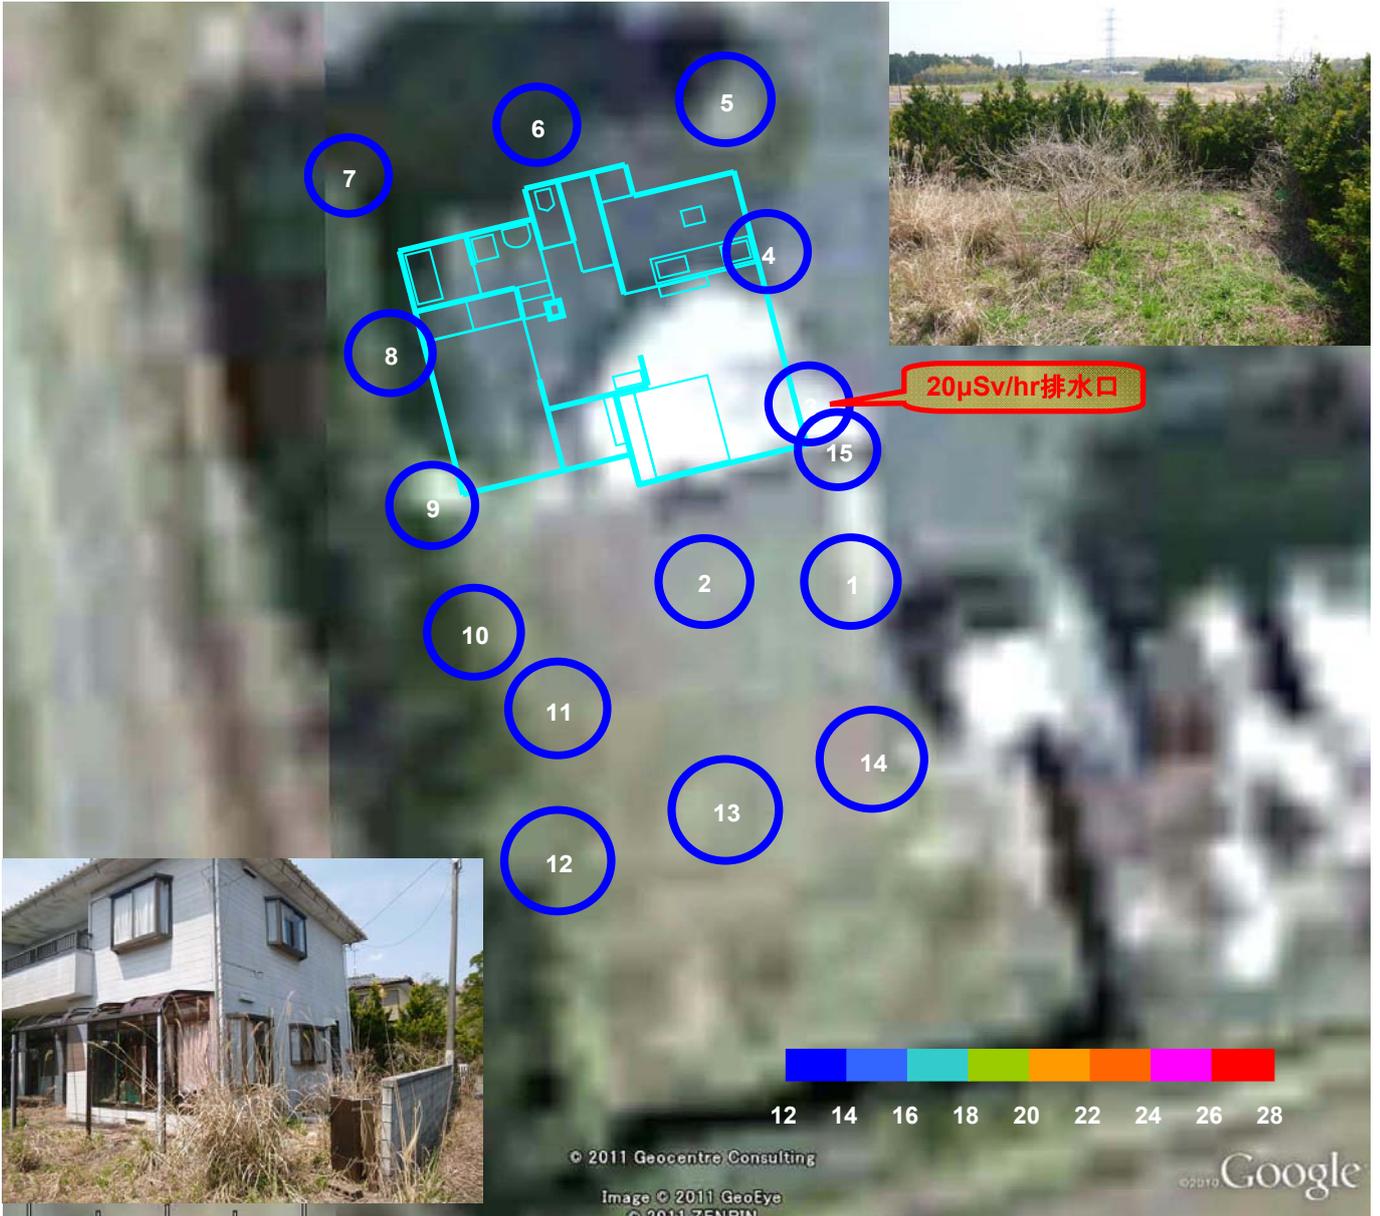

単位 : μ Sv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

| No. | 3/23 | 6/8 | 8/10 | 11/2 | 2/22 | 6/8 | 9/13 | 11/8 | 4/25 | No. | 3/23 | 6/8 | 8/10 | 11/2 | 2/22 | 6/8 | 9/13 | 11/8 | 4/25 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 12.0 | 13.0 | 11.7 | 11.8 | 10.8 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 11 | 15.9 | 14.9 | 18.4 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 9.2 |
| 2 | 12.7 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 12 | 16.4 | 14.9 | 12.9 | 12.8 | 11.7 | 11.0 | 11.2 | 10.3 | 9.9 |
| 3 | 13.3 | 10.6 | 11.8 | 12.7 | 11.4 | 8.7 | 8.6 | 9.5 | 7.6 | 13 | 16.5 | 15.7 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 11.0 | 10.7 | 10.2 | 10.0 |
| 4 | 11.6 | 13.6 | 12.0 | 9.1 | 10.4 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 7.6 | 14 | 15.9 | 15.2 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 9.7 |
| 5 | 12.3 | 14.0 | 12.7 | 13.4 | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 8.6 | 15 | 12.5 | 11.7 | 26.0 | 13.2 | 10.5 | 11.3 | 8.9 | 9.5 | 7.4 |
| 6 | 12.5 | 13.8 | 12.0 | 11.3 | 10.5 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 7.5 | 16 | | | | | | | | | |
| 7 | 13.0 | 13.7 | 12.4 | 11.7 | 10.6 | 10.7 | 12.5 | 9.8 | 7.5 | 17 | | | | | | | | | |
| 8 | 9.4 | 16.9 | 11.3 | 10.2 | 10.3 | 11.0 | 10.2 | 9.9 | 7.9 | 18 | | | | | | | | | |
| 9 | 16.2 | 17.6 | 15.3 | 13.2 | 12.1 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 8.0 | 平均 | 13.6 | 14.0 | 13.5 | 12.1 | 11.1 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 8.4 |
| 10 | 15.6 | 13.4 | 14.1 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 8.7 | 偏差 | 1.18 | 1.14 | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.04 | 1.11 |
